COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMD ZEGVELD

Nieuwsbrief restauratie Hervormde kerk Zegveld

JAARGANG 1, NR. 2 JULI 2018

AGENDA:

Monumenten dag	8 Sept.
Grote veiling	Oktober
El Shaddai kerstzangavond	15 dec.

IN DIT NUMMER:

Omgevingsvergunning	1
Financieel	1
Construc-	2
Commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed	3
Uitstel werkzaamheden	3
Planning restauratie	3
Kerstconcert	4
Veiling	4

Omgevingsvergunning

Op 28 mei heeft de gemeente Woerden de Omgevingsvergunning verleend voor de 1e fase van de geplande restauratie. De wettelijke bezwaartermijn is op 11 juli verlopen en dan kan er gestart worden met de 1e fase van de restauratie van het kerkgebouw.

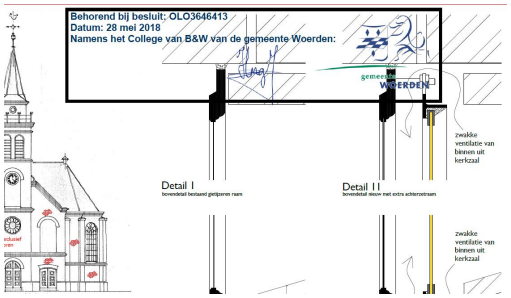

Gemeentelijk besluit restauratie 1e fase

Het CvK heeft op 16 mei in de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed het gehele restauratieplan toegelicht en de commissie is unaniem akkoord met de voorgestelde werkzaamheden van de 1e fase. De commissie Ruimtelijke kwaliteit gaf ons in overweging de 1e fase niet eerder te starten dan na het funderingsherstel. De kans bestaat dat er schade ontstaat door zetting bij het funderingsherstel.
Wat we met deze overweging gedaan hebben daar leest u in deze nieuwsbrief meer over.....

Financieel

In de vorige nieuwsbrief berichten wij u over het noodzakelijke funderingsherstel. Inmiddels is ons in grove lijnen duidelijk wat de meerkosten hiervoor bedragen. Wij denken met een extra bedrag van ú 140.000,- het complete funderingsherstel te kunnen uitvoeren.

Dit is een groot bedrag en we beraden ons nog hoe we de middelen hiervoor kunnen genereren. Vast staat dat we het funderingsherstel wel tijdens deze restauratie meenemen. De kerk is dan voor de toekomst goed gefundeerd en de generaties na ons staan niet voor extra hogere kosten.

Financiele stand per 1 juli 2018:

ú 575.000,-

Vervolg.....Financieel

Het is rustig gebleven voor wat betreft de fondsen die we aangevraagd hebben. 2Select heeft nog een viertal fondsen extra aangevraagd en we hopen op een goede respons daarop. De collecten voor de restauratie op de 1e zondag van de maand hebben tot nu toe het mooie gemiddelde bedrag Ú 1000,- opgebracht.

Verder worden er diverse acties georganiseerd of financiële bijdragen geleverd door gemeenteleden die de restauratie een warm hart toedragen. Samen met alle ontvangen overige giften komt de stand nu op ca. Ú 575.000,- aan toegezegde gelden waar we erg dankbaar voor zijn!

Constructeur

Afgelopen 2 maanden hebben we ons bezig gehouden met het vinden van een constructeur die ons in het funderingsherstel goed kan adviseren. Uit een vijftal offerten hebben we met twee partijen een gesprek gevoerd.

Op basis hiervan hebben we onlangs opdracht verstrekt aan Raadgevend Ingenieursbureau Van Dijke B.V. te Alphen aan de Rijn. Zij beschikken over ruime ervaring in het ontwerpen, berekenen en tekenen van restauraties van kerken.

"onlangs opdracht verstrekt aan Raadgevend Ingenieursbureau Van Dijke B.V. te Alphen aan de Rijn

Voor de bouwvak overleggen zij aan het CvK hun eerste ontwerpuitgangspunten van het funderingsherstel. De heer Aales van Leeuwen van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Zuid-Holland begeleidt ons hierin om de juiste keuzes te maken.
Nadat de ontwerpuitgangspunten definitief zijn kunnen we een omgevingsvergunning aanvragen en de funderingswerkzaamheden aanbesteden. Hoe we dit precies gaan doen werken we nog verder uit.....

Commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed

Het overleg met de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed heeft op 16 mei j.l. plaatsgevonden. We hebben de gehele restauratie kunnen toelichten. De problematiek van onze kerk is hen helder geworden en zij begrijpen de ingreep die voorgesteld is.
De commissie is echter geen voorstander van een voorzetwand met gips in de kerk en adviseert ons om de kerk te stucadoren. Het CvK had dat ook graag gewild maar is van mening dat de problemen uit het verleden met het stucwerk en nu met de huidige tegel aanleiding zijn om definitief af te rekenen met de vochtdoorslag en zoutaantasting door het plaatsen van een voorzetwand. De commissie vraagt ons dit bij de vergunningaanvraag goed te onderbouwen en te detailleren hetgeen wij zullen doen. De wand achter de preekstoel kunnen we wel voorzien van een stuclaag.

" De commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed adviseert ons de kerk te stucadoren."

Uitstel werkzaamheden

Hoewel de omgevingsvergunning verleent is heeft het CvK, mede op advies van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed toch moeten besluiten de werkzaamheden van de 1e fase uit te stellen.

Reden hiervoor is dat door de ingrijpende funderingsverbetering er constructieve zettingen kunnen optreden met als gevolg daarvan scheuren in het nieuwe voegwerk.

Met De Heeren Bouwmeesters is overeengekomen de planning uit te stellen en we hebben kunnen afspreken dat de prijs vast is tot eind 2019.

" .....er constructieve zettingen kunnen optreden....."

Planning restauratie

We begrijpen dat het een teleurstelling is dat nog niet begonnen wordt aan de 1e fase van de restauratie. We zijn nu voornemens de gehele restauratie in één keer in 2019 te realiseren. Dit zou ongeveer betekenen dat we rond april/mei volgend jaar starten met het funderingsherstel en we hopen dan voor de 1e adventsweek de nieuwe kerk weer te kunnen betrekken.

In die periode zullen we elders moeten kerken waarover we in gesprek zijn met de Milandhof.



Noteert u alvast 15 december in uw agenda!

Kerstconcert

Zaterdagavond 15 december 2018 hoopt gospelkoor El Shaddai uit Lopik een kerstconcert te verzorgen ten bate van de restauratie van onze kerk. Noteert u alvast deze datum in uw agenda want het belooft een mooie avond te worden.
In een volgende nieuwsbrief meer info over tijd en toegangsprijs.

Veiling

"...Dit zouden goederen kunnen zijn waar je zelf op uitgekeken bent ...."

In oktober 2018 wil de Commissie fondsenwerving restauratie een (grote) veiling organiseren van waardevolle goederen. Dit zouden goederen kunnen zijn waar je zelf op uitgekeken bent maar die zeker (historisch) nog waarde hebben. Dit hoeft niet altijd antiek te zijn. Het kunnen ook oude gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, schilderijen of alles voor in en om het huis zijn.

De stukken kunt u via foto's (graag digitaal)aanmelden via het mailadres: restauratie@hervormdzegveld.nl.
Of per post sturen naar Map Uittenbogaard, Broeksloot 4, 3474 HP Zegveld.

Als er gemeente leden zijn die hier ervaring in hebben en ons hier in kunnen adviseren houden wij ons aanbevolen.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Hervormde gemeente Zegveld.
Adres: Hoofdweg 72
E-mail: restauratie@hervormdzegveld.nl
Internet: www.hervormdzegveld.nl
